


Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	24	Сен '25					Окт '25			
0			msproj11	190 дней	Пн 08/09/25	Пт 29/05/26			608,000.00₽										
1			Проект	190 дней	Пн 08/09/25	Пт 29/05/26			608,000.00₽										
2			Инициализация и планирование	22 дней	Пн 08/09/25	Вт 07/10/25			70,400.00₽										
3			Анализ предметной области	7 дней	Пн 08/09/25	Вт 16/09/25		Разработчик	22,400.00₽										
4			Обоснование реализуемости	7 дней	Ср 17/09/25	Чт 25/09/25	3	Разработчик	22,400.00₽										
5			Разработка и согласование устава	5 дней	Пт 26/09/25	Чт 02/10/25	4	Руководитель[20]	16,000.00₽										
6			Утверждение плана	3 дней	Пт 03/10/25	Вт 07/10/25	5	Разработчик, Рук	9,600.00₽										
7			План проекта	0 дней	Вт 07/10/25	Вт 07/10/25	6		0.00₽										
8			Формализация предметной области	17 дней	Ср 08/10/25	Чт 30/10/25			54,400.00₽										



Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	24	Сен '25					Окт '25			
9			Анализ методов глобальной	7 дней	Ср 08/10/25	Чт 16/10/25	7	Разработчик, Рук	22,400.00₽										
10			Формирование тестовых эпидемиологических моделей	7 дней	Пт 17/10/25	Пн 27/10/25	9	Разработчик	22,400.00₽										
11			Генерация синтетических данных	3 дней	Вт 28/10/25	Чт 30/10/25	10	Разработчик	9,600.00₽										
12			Модели и данные	0 дней	Чт 30/10/25	Чт 30/10/25	11		0.00₽										
13			Проектирование архитектуры	18 дней	Пт 31/10/25	Вт 25/11/25			57,600.00₽										
14			Построение диаграмм	3 дней	Пт 31/10/25	Вт 04/11/25	12	Разработчик	9,600.00₽										
15			Построение диаграмм потоков	4 дней	Ср 05/11/25	Пн 10/11/25	14	Разработчик	12,800.00₽										

--

Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	Сен '25					Окт '25				
										24	31	07	14	21	28	05	12	19	
16			Проектирование логических компонентов системы (component)	4 дней	Вт 11/11/25	Пт 14/11/25	15	Разработчик	12,800.00₽										
17			Описание API между	3 дней	Пн 17/11/25	Ср 19/11/25	16	Разработчик	9,600.00₽										
18			Создание ТЗ	4 дней	Чт 20/11/25	Вт 25/11/25	17	Разработчик, Рук	12,800.00₽										
19			ТЗ утверждено	0 дней	Вт 25/11/25	Вт 25/11/25	18		0.00₽										
20			Разработка модуля глобальной оптимизации	39 дней	Ср 26/11/25	Пн 19/01/26			124,800.00₽										
21			Реализация G	5 дней	Ср 26/11/25	Вт 02/12/25	19	Разработчик	16,000.00₽										
22			Реализация C	5 дней	Ср 03/12/25	Вт 09/12/25	21	Разработчик	16,000.00₽										
23			Реализация F	5 дней	Ср 10/12/25	Вт 16/12/25	22	Разработчик	16,000.00₽										
24			Реализация E	5 дней	Ср 17/12/25	Вт 23/12/25	23	Разработчик	16,000.00₽										
25			Реализация I	5 дней	Ср 24/12/25	Вт 30/12/25	24	Разработчик	16,000.00₽										
26			Тестирование методов	7 дней	Ср 31/12/25	Чт 08/01/26	25	Разработчик	22,400.00₽										

Project: msproj11
Date: Чт 20/11/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary





















Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Выполнение задач, запланированных вручную



















Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	Сен '25								Окт '25			
										24	31	07	14	21	28	05	12	19			
27			Интеграция методов в	7 дней	Пт 09/01/26	Пн 19/01/26	26	Разработчик	22,400.00₽												
28			Модуль оптимизации разработан	0 дней	Пн 19/01/26	Пн 19/01/26	27	0.00₽													
29			Модуль верификации	21 дней	Вт 20/01/26	Вт 17/02/26		67,200.00₽													
30			Реализация проверки достоверности параметров	5 дней	Вт 20/01/26	Пн 26/01/26	27	Разработчик	16,000.00₽												
31			Реализация анализа	4 дней	Вт 27/01/26	Пт 30/01/26	30	Разработчик	12,800.00₽												
32			Реализация симуляций для оценки	4 дней	Пн 02/02/26	Чт 05/02/26	31	Разработчик	12,800.00₽												
33			Интеграция с оптимизацией	4 дней	Пт 06/02/26	Ср 11/02/26	32	Разработчик	12,800.00₽												
34			Тестирование	3 дней	Чт 12/02/26	Пн 16/02/26	33	Разработчик	9,600.00₽												

Project: msproj11
Date: Чт 20/11/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary





















Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Выполнение задач, запланированных вручную



















Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	Сен '25								Окт '25			
										24	31	07	14	21	28	05	12	19			
35			Документирс	1 день	Вт 17/02/26	Вт 17/02/26	34	Разработчик	3,200.00₽												
36			Модуль верификации разработан	0 дней	Вт 17/02/26	Вт 17/02/26	35	Разработчик	0.00₽												
37			Модуль интеграции данных	20 дней	Ср 18/02/26	Вт 17/03/26			64,000.00₽												
38			Реализация подключения к внешним источникам	7 дней	Ср 18/02/26	Чт 26/02/26	35	Разработчик	22,400.00₽												
39			Модуль очистки и нормализации	3 дней	Пт 27/02/26	Вт 03/03/26	38	Разработчик	9,600.00₽												
40			Модуль валидации	3 дней	Ср 04/03/26	Пт 06/03/26	39	Разработчик	9,600.00₽												
41			Тестирование	4 дней	Пн 09/03/26	Чт 12/03/26	40	Разработчик	12,800.00₽												
42			Документирс	3 дней	Пт 13/03/26	Вт 17/03/26	41	Разработчик	9,600.00₽												
43			Модуль интеграции	0 дней	Вт 17/03/26	Вт 17/03/26	42		0.00₽												

Project: msproj11
Date: Чт 20/11/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary





















Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Выполнение задач, запланированных вручную



















Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	Сен '25					Окт '25			
										24	31	07	14	21	28	05	12	19
44			Разработка веб-интерфейса и визуализации	24 дней	Ср 18/03/26	Пн 20/04/26			76,800.00₽									
45			Реализация интерфейса параметризации	5 дней	Ср 18/03/26	Вт 24/03/26	42	Разработчик	16,000.00₽									
46			Реализация интерфейса верификации	5 дней	Ср 25/03/26	Вт 31/03/26	45	Разработчик	16,000.00₽									
47			Интеграция с backend	7 дней	Ср 01/04/26	Чт 09/04/26	46	Разработчик	22,400.00₽									
48			Тестирование интерфейса	4 дней	Пт 10/04/26	Ср 15/04/26	47	Разработчик	12,800.00₽									
49			Документирование	3 дней	Чт 16/04/26	Пн 20/04/26	48	Разработчик	9,600.00₽									
50			Веб-интерфейс разработан	0 дней	Пн 20/04/26	Пн 20/04/26	49		0.00₽									
51			Интеграция всех модулей	17 дней	Вт 21/04/26	Ср 13/05/26			54,400.00₽									
52			Подключение всех API	7 дней	Вт 21/04/26	Ср 29/04/26	49	Разработчик	22,400.00₽									

Project: msproj11
Date: Чт 20/11/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary





















Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Выполнение задач, запланированных вручную






















Ид.		Режим задачи	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Затраты	Сен '25					Окт '25				
										24	31	07	14	21	28	05	12	19	
53			Тестирование функциональной целостности	5 дней	Чт 30/04/26	Ср 06/05/26	52	Разработчик	16,000.00₽										
54			Тестирование отказоустойчивости	5 дней	Чт 07/05/26	Ср 13/05/26	53	Разработчик	16,000.00₽										
55			Продукт функционирует	0 дней	Ср 13/05/26	Ср 13/05/26	54		0.00₽										
56			Завершение проекта	12 дней	Чт 14/05/26	Пт 29/05/26			38,400.00₽										
57			Подготовка пользовательских инструкций	7 дней	Чт 14/05/26	Пт 22/05/26	55	Разработчик	22,400.00₽										
58			Согласование с заказчиком	5 дней	Пт 22/05/26	Пт 29/05/26	57	Заказчик(фонд)(ИТ)	16,000.00₽										
59			Продукт приглашен на тестирование	0 дней	Пт 29/05/26	Пт 29/05/26	58		0.00₽										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

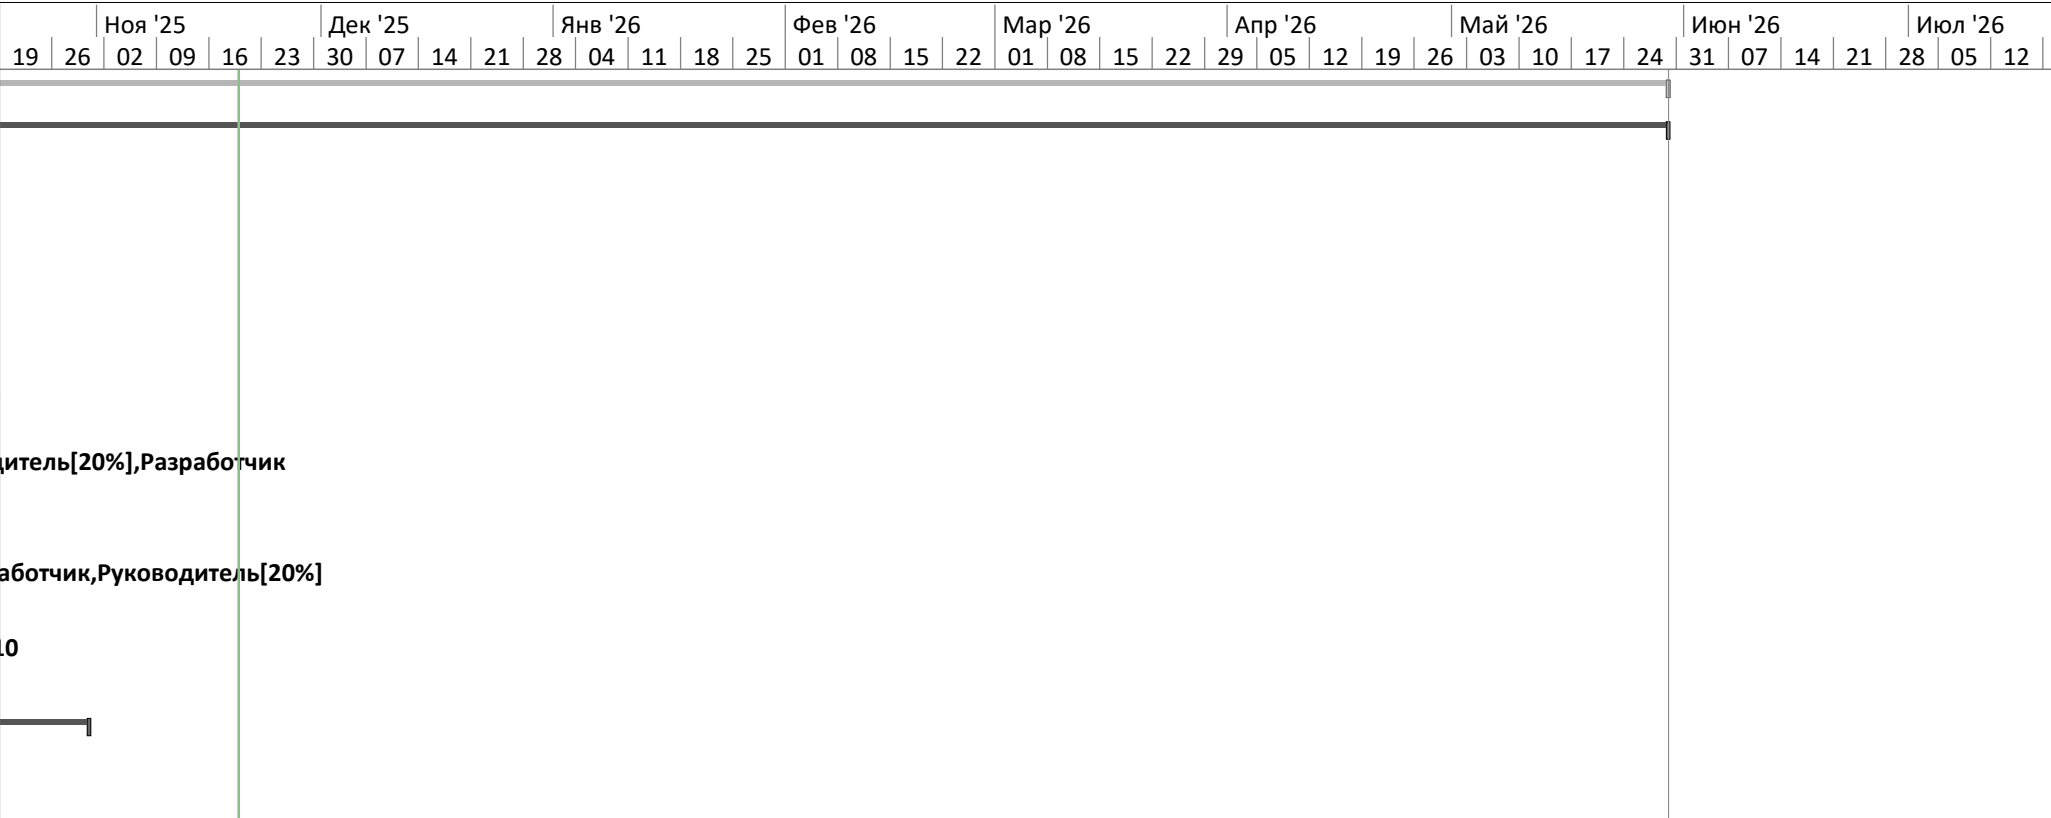


Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

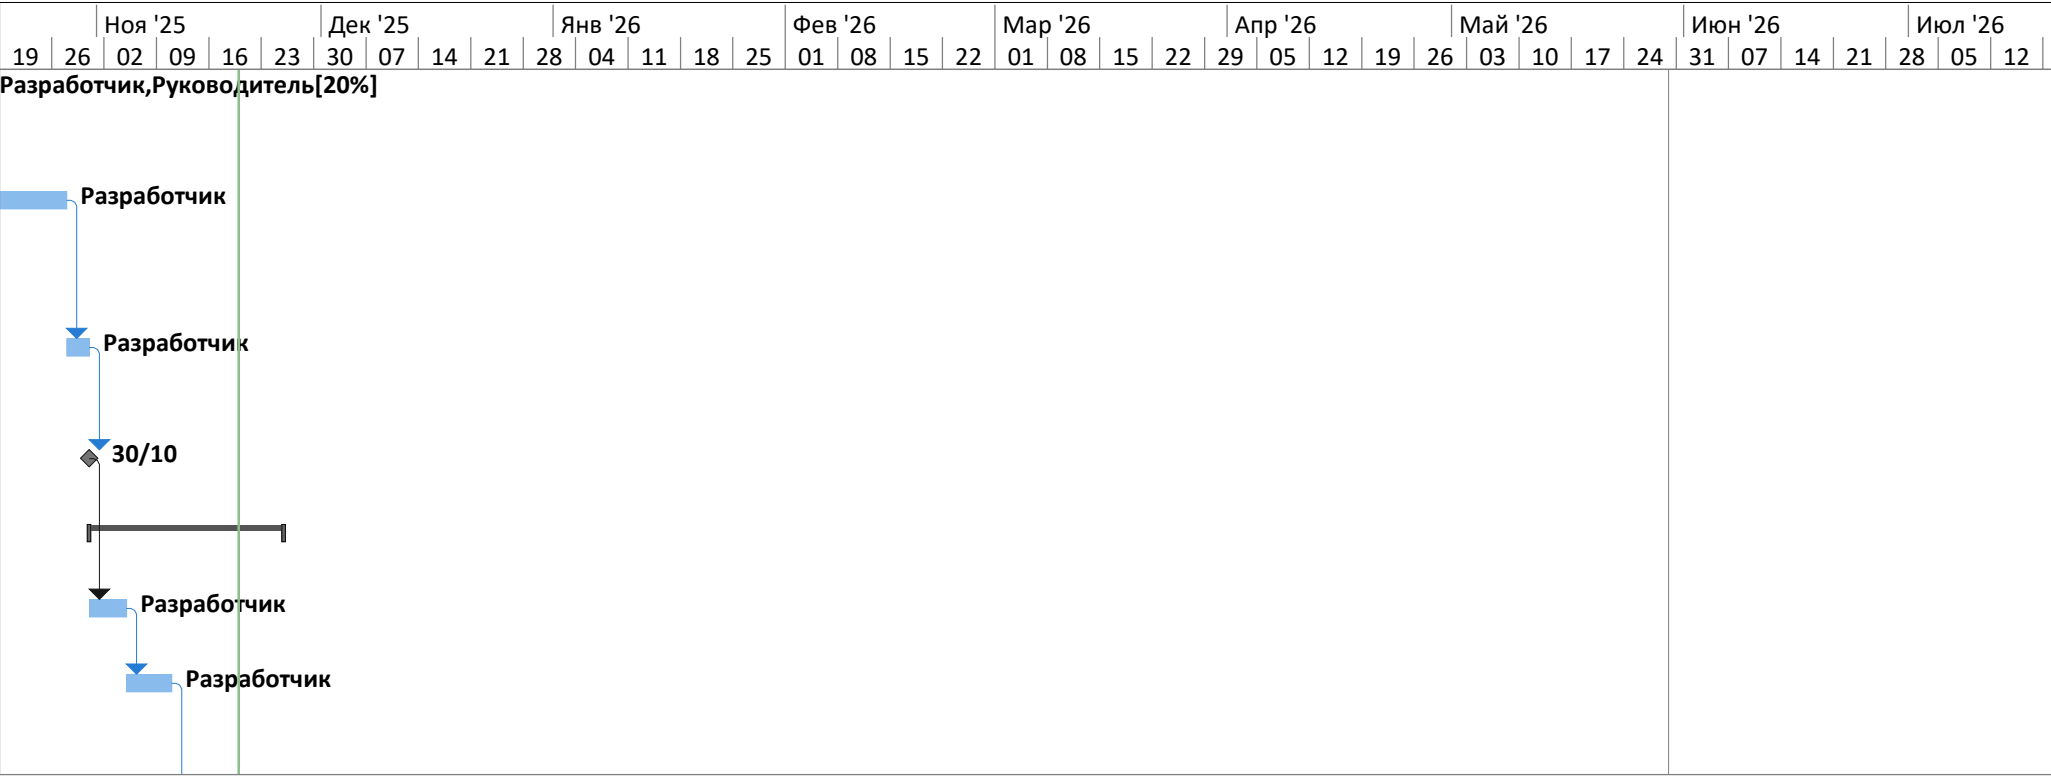


Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

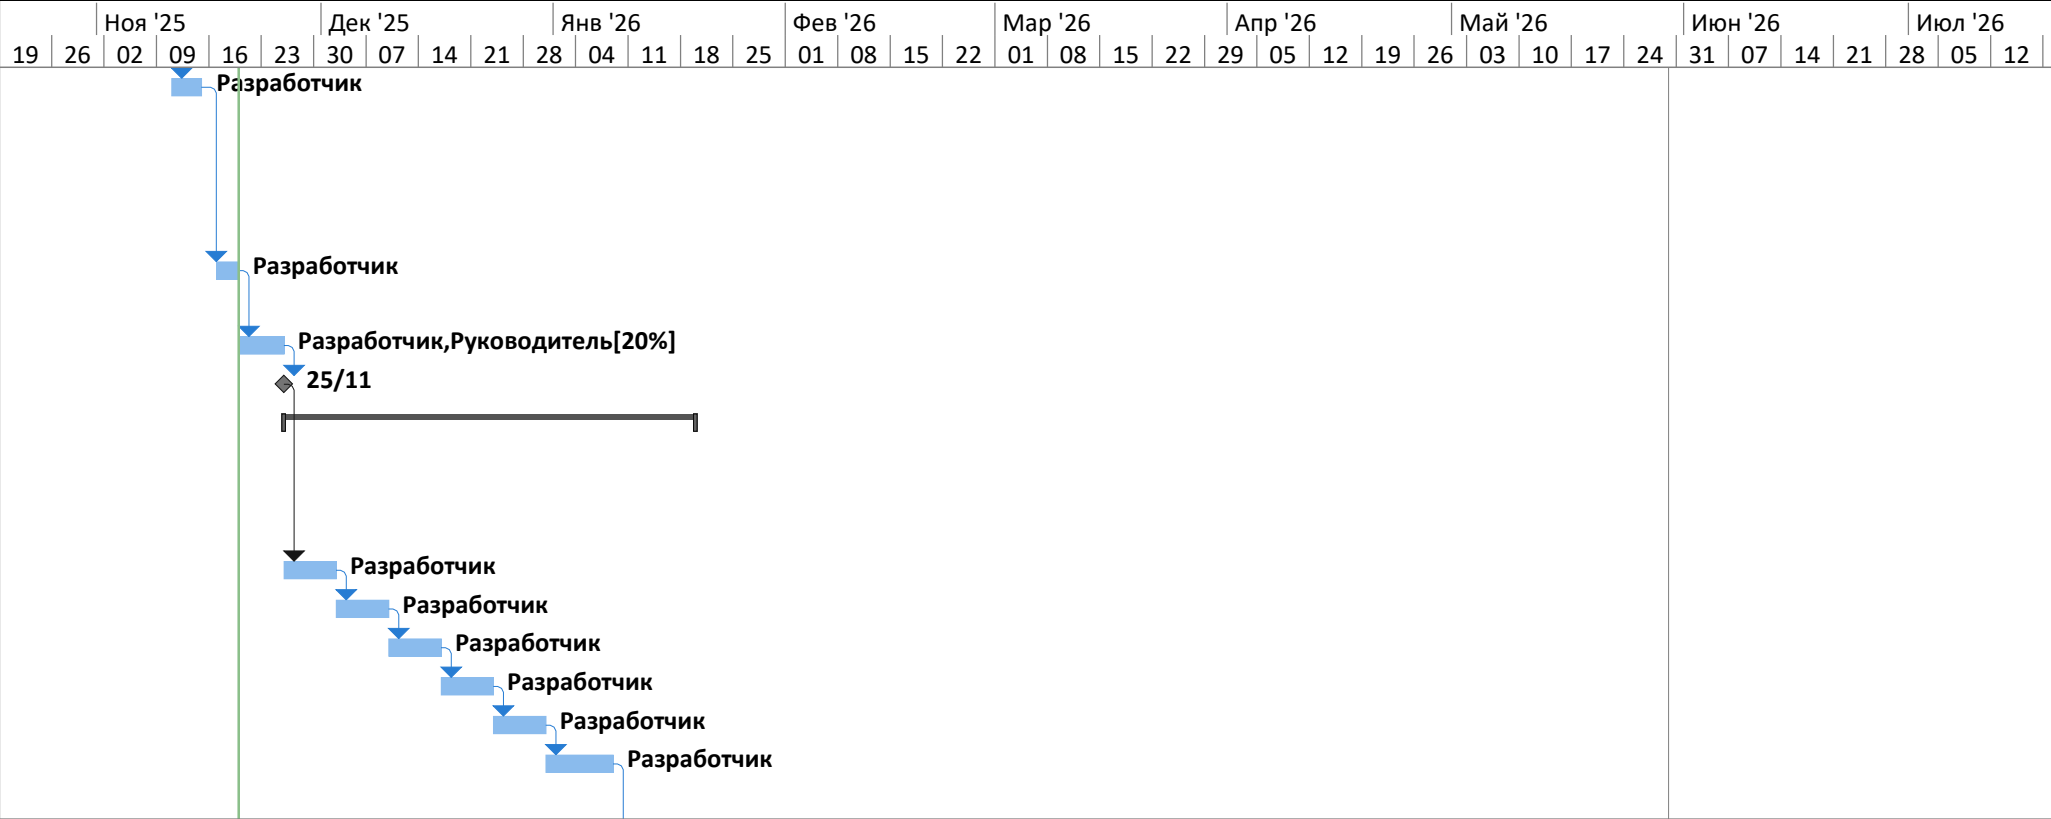



Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

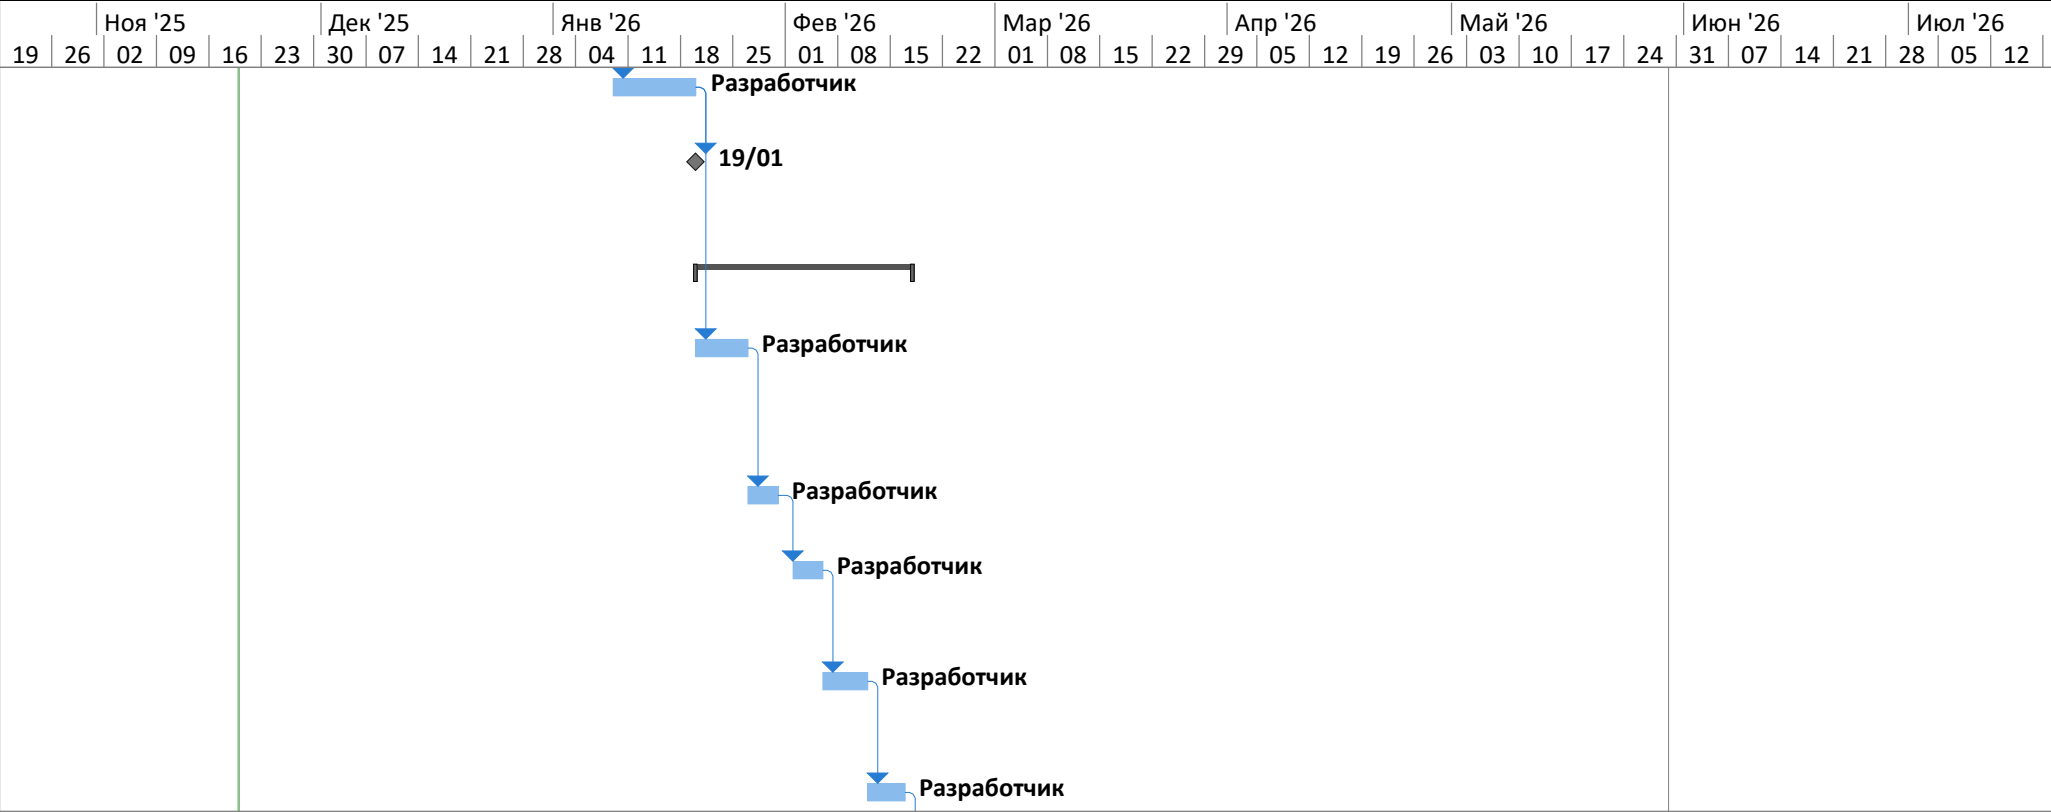


Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

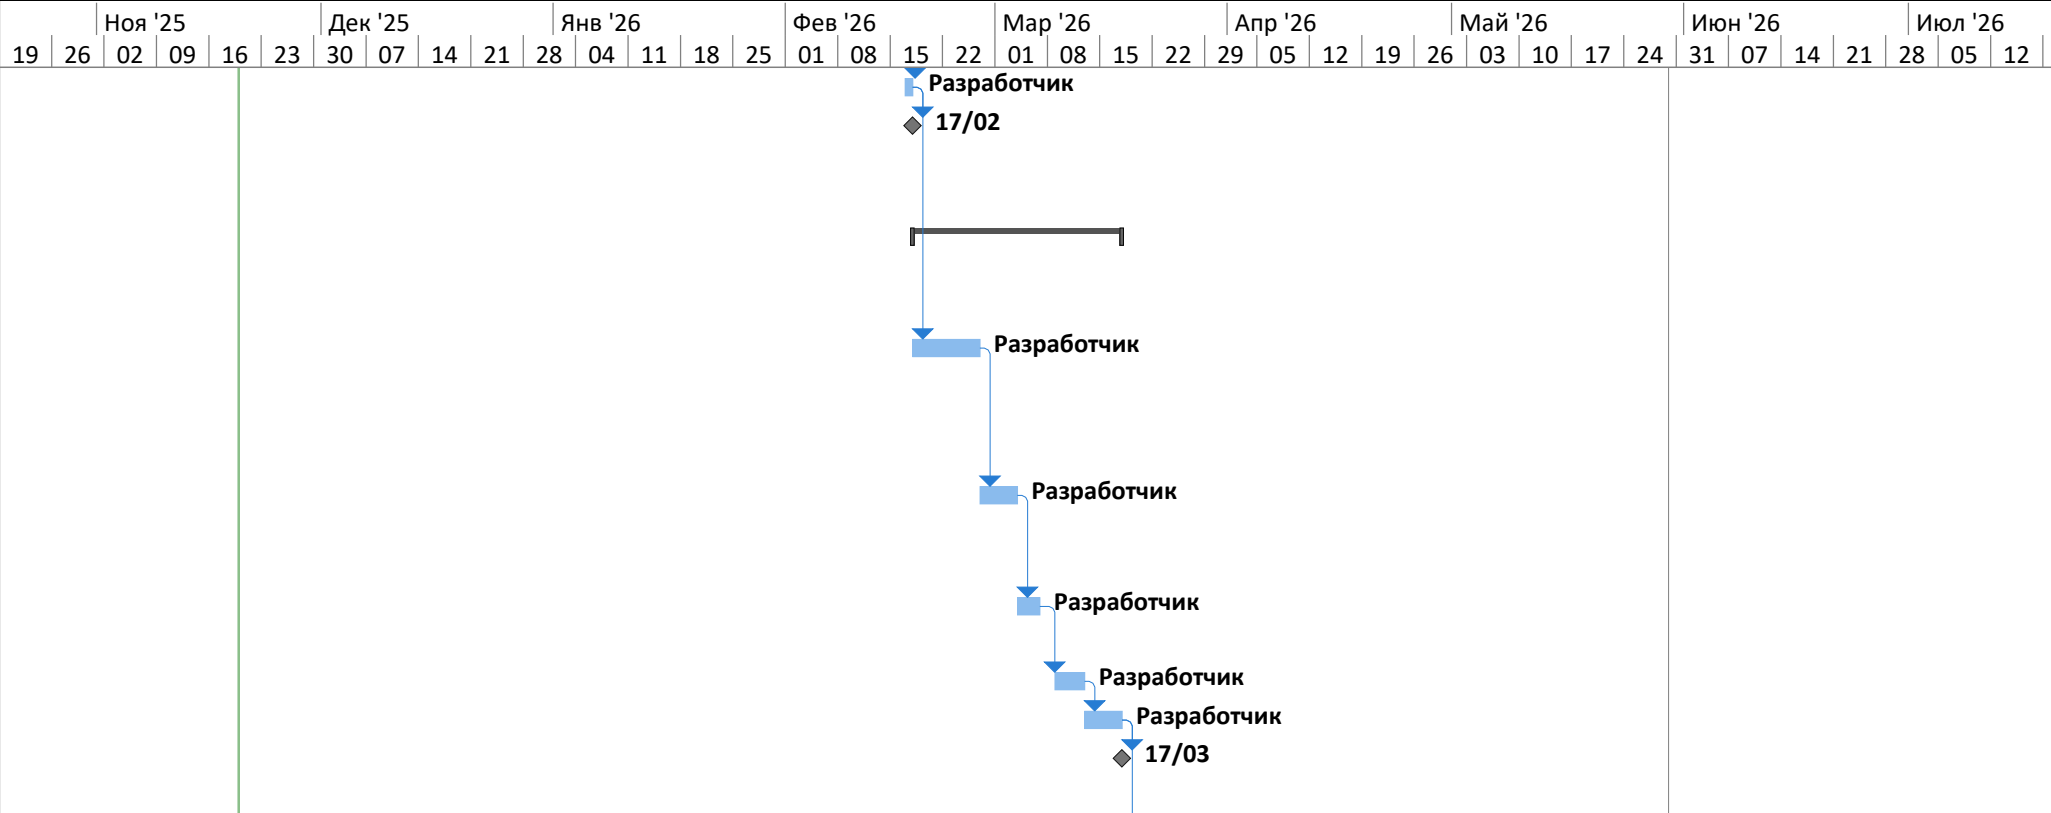

Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

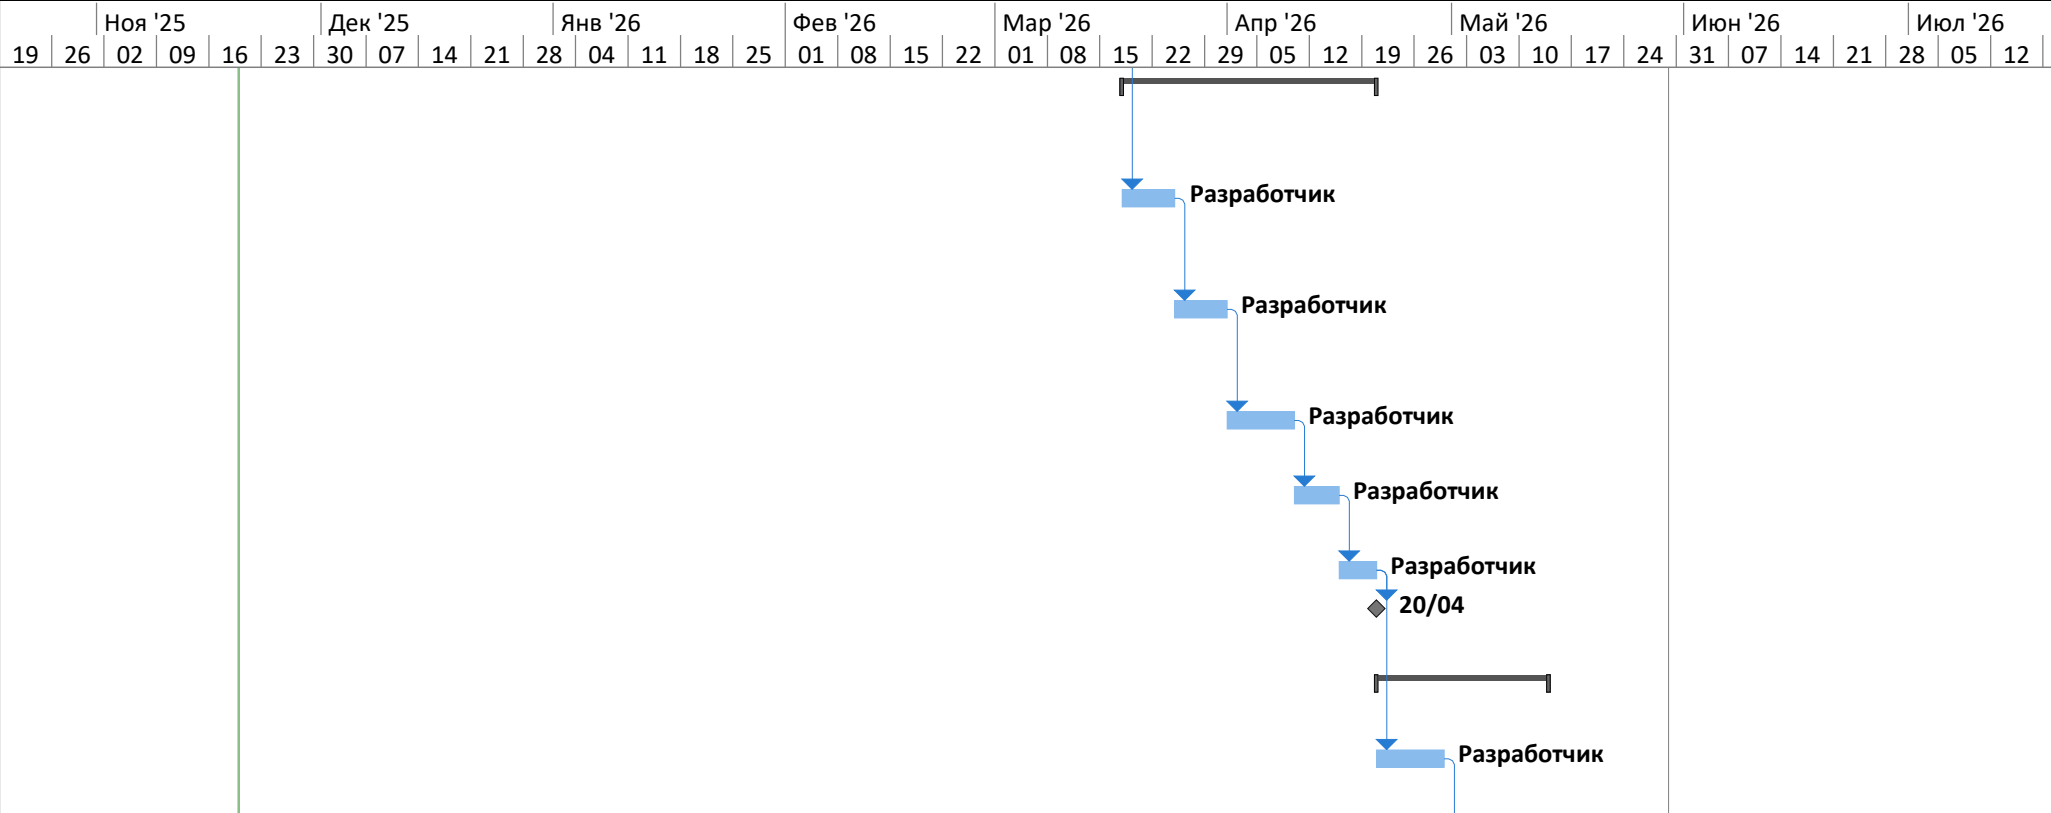

Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			

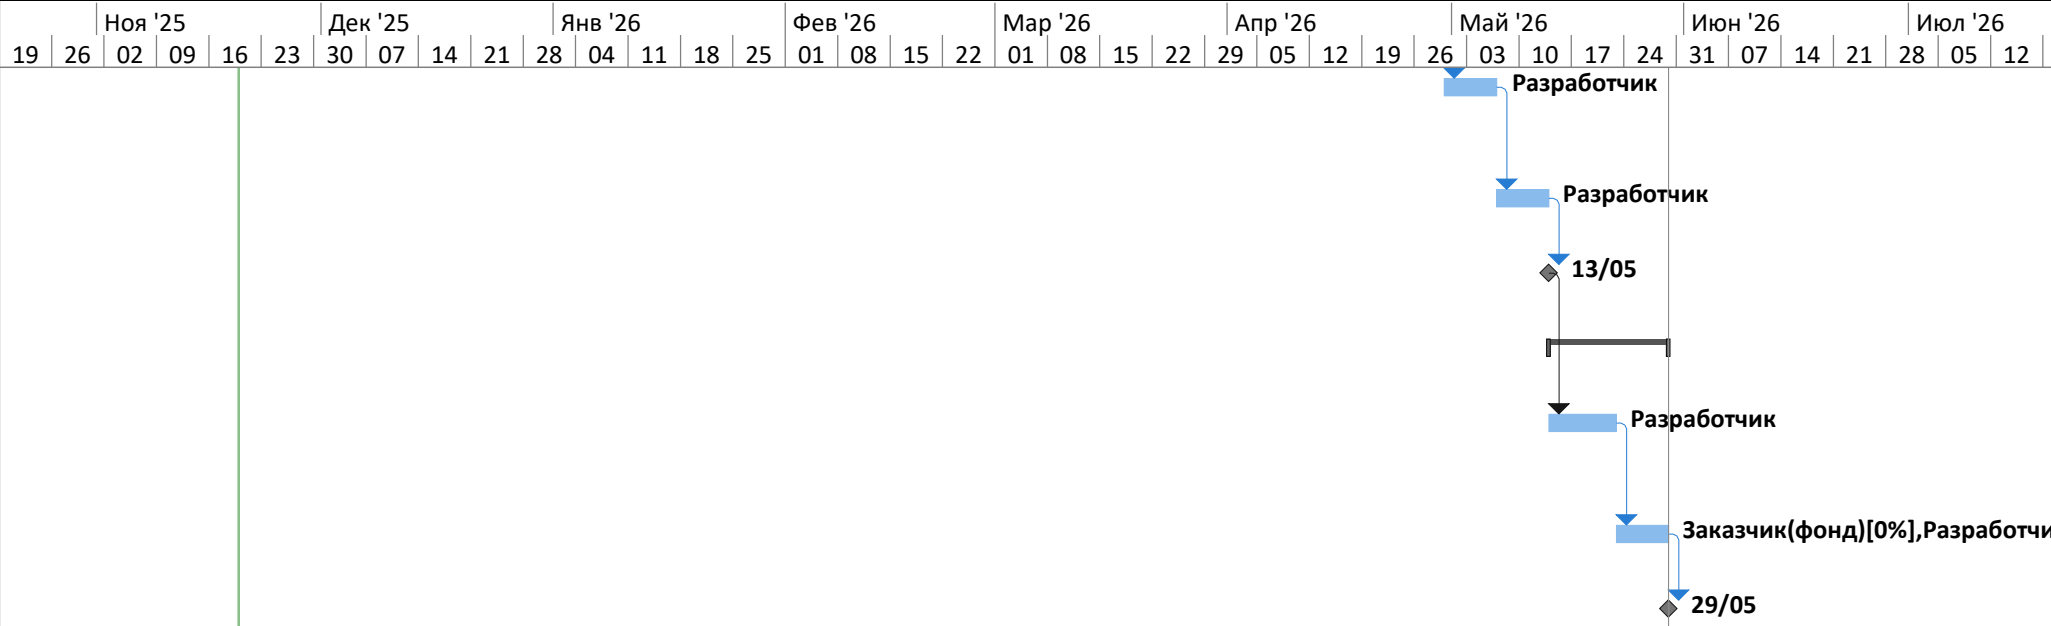

Project: msproj11 Date: Чт 20/11/25	Task		Manual Task	
	Split		Duration-only	
	Milestone		Manual Summary Rollup	
	Summary		Manual Summary	
	Project Summary		Start-only	
	External Tasks		Finish-only	
	External Milestone		Deadline	
	Inactive Task		Progress	
	Inactive Milestone		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Inactive Summary			
